




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
آذربایجان غربی
معاونت امور بهداشتی

خلاصه گزارشی از روند احداث ۵۳۳ واحد ارائه خدمات بهداشتی در قالب طرح تحول سلامت استان آذربایجان غربی ۹۶-۱۳۹۳



تسهيلات زایمانی مجتمع خدمات سلامت باروری مادر
(حاشیه شهر ارومیه)

اختصاصی اولین جشنواره عمران سلامت

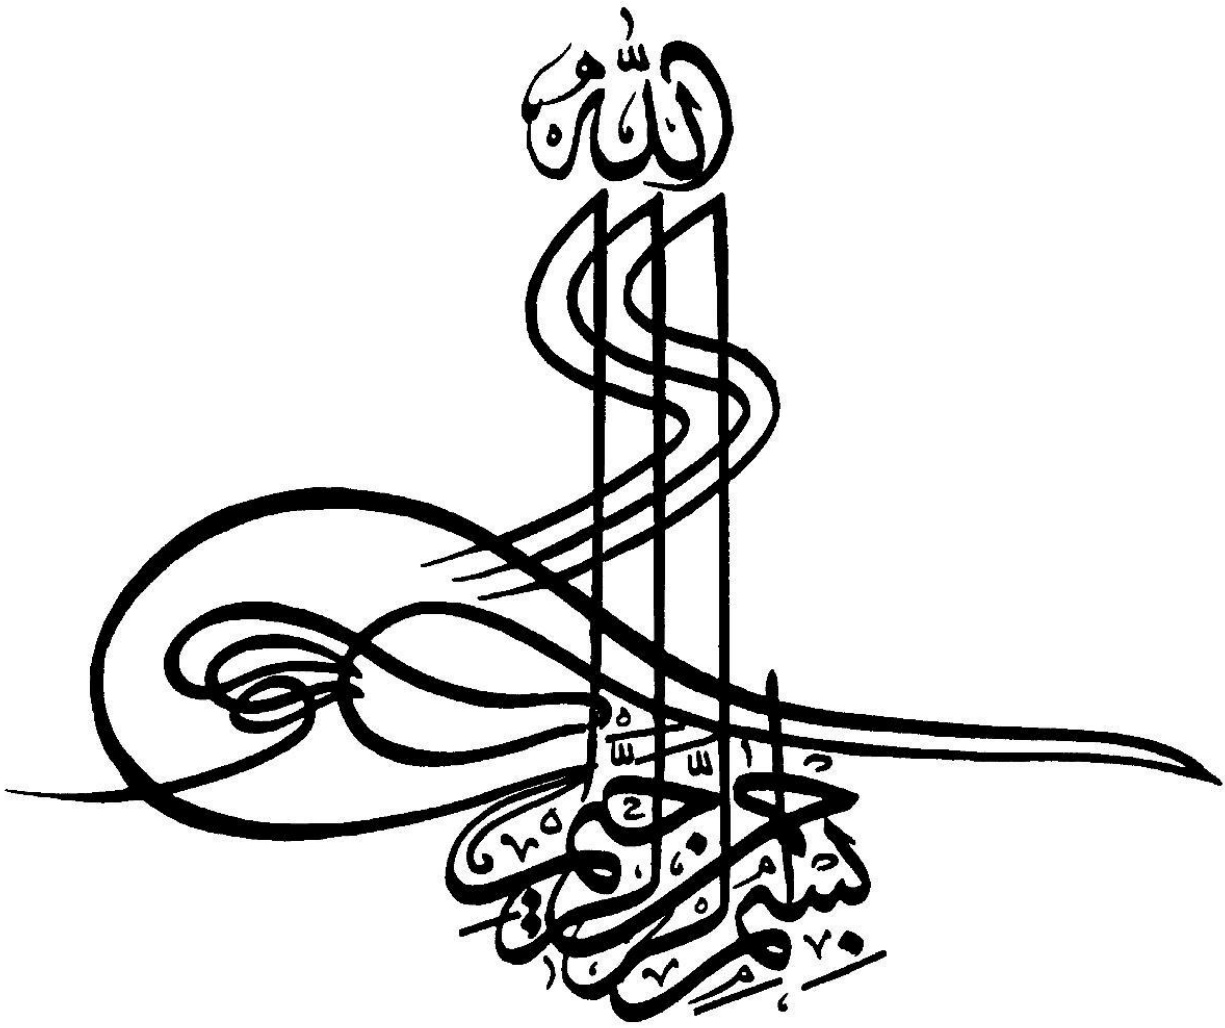



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
آذربایجان غربی

معاونت امور بهداشتی

**خلاصه گزارشی از روند احداث ۵۳۳ واحد
ارائه خدمات بهداشتی در قالب طرح تحول سلامت
استان آذربایجان غربی
۹۶-۱۳۹۳**

فهرست

مقدمه ریاست دانشگاه	۱
خلاصه اجرایی	۳
روند احداث ۱۸۳ خانه بهداشت	۷
روند شکل گیری احداث ۳۵۰ واحد ارائه خدمات	۱۲
مشخصات فنی پروژه ها	۲۲
تیپ بندی واحدها	۲۴
روند احداث واحدهای بهداشتی تا پایان سال ۱۳۹۵ (فاز یک)	۳۶
روند احداث واحدهای بهداشتی در سال ۱۳۹۶	۴۴
واحد های بهداشتی پیمان سپاری شده در سه ماهه اول ۱۳۹۶	۵۳



کاری که درباره طرح تحول نظام سلامت انجام گرفته کار بسیار خوبی است.
سعی کنید این طرح ادامه پیدا کند، پشتیبانی شود و متوقف نگردد.

مقام معظم رهبری



اولین قدم مابحث **بهداشت** است،

باید همه تلاش کنیم که در زمینه **بهداشت** موفق شویم

و اگر نتوانستیم، به سمت درمان حرکت کنیم.



شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی کشور

(PHC) قلب فعالیت های

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است



با توجه به فرسوده و استیجاری بودن مراکز بهداشتی درمانی،
امیدوارم با این فرصت معتنم به دست آمده اغلب نقاط
مهم و محروم حاشیه شهرها و مناطق روستایی استان
از خدمات مناسب بهره مند شوند.

بسمه تعالی



طرح تحول نظام سلامت که مولود ماندگار دولت تدبیر و امید است و دوره رشد و تکاملی خود را طی میکند و همزمانی اجرای این طرح بزرگ با ابلاغ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بارقه امیدی در چشم انداز بهار سلامت شهروندان جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است.

طرح تحول نظام سلامت که با رویکرد عدالت در پاسخگویی و عدالت در توزیع و کاهش هزینه های کمرشکن درمانی طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است، توانسته جایگاه نظام سلامت در عرصه اجتماعی را ارتقا و بی بدیل سازد و

بسان مرواریدی در میان برنامه های بسیار مهم دولت حتی در عرصه جهانی خودنمایی میکند.

موضوع احداث واحدهای بهداشتی بخصوص خانه های بهداشت در راستای برگزاری جشن تکمیل نظام شبکه و در سال ۹۳ مطرح شد، که علیرغم برنامه ریزی های اولیه جهت احداث واحدها با مشارکت بین بخشی و موفقیت آمیز نبودن روند پیش بینی شده در سطح استان و حتی سطح ملی دانشگاه علوم پزشکی راسا در این مقوله مداخله نمود و در طی مدتی کمتر از یک سال ۱۸۳ باب خانه بهداشت را در سطح روستاهای استان احداث نمود.

در جریان سفر پرخیر و برکت جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیئت محترم دولت به استان در خرداد ماه سال ۱۳۹۵، احداث واحدهای بهداشتی بسیار قدیمی را با جناب آقای دکتر هاشمی طرح نموده و با توجه به موافقت ایشان و اعلام حمایت جناب آقای سعادت استاندار جهادی استان که همیشه حامی نظام سلامت بوده اند مورد اهتمام ویژه دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و تفاهم اولیه که مشتمل بر یکصد واحد بود، پس از پیگیری های مکرر و مذاکرات حضوری با وزیر محترم بهداشت درمان تعداد واحدهای احداثی در ماههای پایانی سال به ۳۴۰ مورد افزایش پیدا کرد و مورد استقبال استاندار محترم استان نیز واقع گردید. تا پایان سال ۱۳۹۵ روند احداث این واحدها بیش از تعداد مورد تفاهم اولیه بود و ۱۳۷ پروژه پیمان سپاری و ۲۷ پروژه نیز پس از اتمام مراحل ساخت دردست بهره برداری قرار گرفته است.

در مجموع و در طی دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید و در قالب طرح تحول سلامت (طی سه سال اخیر) در حوزه بهداشت ۵۳۳ پروژه دردست احداث قرار گرفته و ۶۰ درصد پروژه ها پیمان سپاری شده و مابقی طی ماههای آتی به پیمان واگذار خواهد شد. بررسی ها نشان میدهند که این حجم عظیم پروژه های عمرانی در قالب ۵۳۳ پروژه و در حدود ۱۳۹۰۰۰ متر مربع در حوزه بهداشت و در مدت سه سال، طی یکصد سال اخیر بی سابقه میباشد. این موفقیت بزرگ و غرور آفرین مرهون تعهد سیاسی دولت تدبیر و امید در قالب طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت است که بدون مساعدت ها و حمایت های همه جانبه جناب آقای سعادت و مجموعه مدیران علاقمند و متعهد استان و تلاش ها و پیگیری های مجدانه همکاران اینجانب در سطح دانشگاه و شبکه های بهداشت و درمان امکان پذیر نبود که لازم میدانم از جناب آقای دکتر هاشمی وزیر دلسوز، سخت کوش و تلاشگر بهداشت درمان و بلند نظری و الطاف مدیریت ارشد استان

در حق نظام سلامت و سلامتی آحاد جامعه استان صمیمانه قدردانی نمایم و یقین دارم این خدمت بس بزرگ در خاطره تاریخ اجتماعی استان ماندگار خواهد بود.

اهتمام دانشگاه علوم پزشکی در اقدام به این امر بزرگ و گسترده به پشتوانه و دلگرمی نمایندگان معزز مردم شریف این خطه در جای جای استان انجام گرفته و میگیرد که جای دارد از این بزرگواران که دلسوزانه پیگیر مطالبات مردمی هستند صمیمانه سپاسگزاری نمایم و حمایت همه جانبه نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی را پاس میدارم.

ضرورت تامین منابع مالی این حجم عظیم از برنامه عمرانی و سهم بندی منابع مالی مورد نیاز احداث این پروژه ها نیز از اولین دغدغه های مدیریت نظام اجتماعی و سلامت استان بود که براساس تفاهات بعمل آمده مقرر گردید ۱۵ درصد از هزینه های اجرایی توسط خیرین سلامت استان تامین شود که در قالب شورای خیرین سلامت در کلیه شهرستانهای تابعه تشکیل گردیده و منشا خدمات بسیار ارزنده ای شده اند که امید می رود رشحات نیکوکاران عرصه سلامت در این مقوله نیز صحنه های زیبایی از اعمال خیر را ثبت وضبط نموده و پتانسیل غنی نیکوکاران استان را به منصه ظهور برساند.

همچنین همکاریهای صمیمانه اعضای ستاد استانی- فرمانداران- شهرداران- اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز تلاشهای خستگی ناپذیر همکارانم در ستاد دانشگاه و مدیریت شبکه های بهداشت درمان را ارج نهاده و از خداوند متعال توفیق روزافزون این عزیزان را مسئلت مینمایم. خداوندمنان را بخاطر اعطای توفیق مشارکت در این امر بسیار مهم را شاکر میباشم و بسیار خرسند هستم این موفقیت شرف آفرین را به خالقان این اثر ماندگار و بهره مندان از این نعمت بی منت جمهوری اسلامی ایران، مردم فهیم و شریف استان، تبریک و تهنیت بگویم.

دکتر آقازاده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

خلاصه اجرایی

نظام سلامت کشورمان دوران متفاوت و متمایزی را طی میکند. ابلاغ سیاست های کلی سلامت و سیاست های جمعیتی کشور توسط مقام معظم رهبری، اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبیر و امید در اقصی نقاط کشور شور و شوق وصف ناپذیری در نظام سلامت ایجاد کرده و پویایی مضاعفی را در عرصه سلامت رقم زده است.

طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ در دستور کار حوزه معاونت بهداشت وزارت متبوع قرار گرفت و در طی کمتر از دو سال، چهارچوب کاری تکمیل و در قالب ۱۵ برنامه ملی و ۱۰ پروژه پشتیبان مورد اهتمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفت. دومین پروژه پشتیبان طرح تحول بهداشت تکمیل، تجهیز و توسعه شبکه بهداشتی درمانی کشور بود که مشتمل بر اقدامات بسیاری از قبیل بازنگری تشکیلات سازمانی و نیروی انسانی در مناطق روستایی، شهری و حاشیه شهرها، بهبود استاندارد و تجهیز فضاهای فیزیکی واحد های ارائه خدمات میباشد.

نوسازی واحد های ارائه خدمات یکی از دغدغه های مدیریت دستگاههای دولتی بخصوص نظام سلامت است تا بتواند خدمات خود را در فضایی متناسب و به روز شده در اختیار گیرندگان خدمات قرار دهد و از این رهگذر ضمن ارتقای وضعیت فضای شهری موجبات رضایت شهروندان بخصوص مراجعین و ارائه کنندگان خدمات گردد. برای اولین بار در طرح تحول سلامت مقرر گردید نیاز نظام سلامت کشور به بهسازی و نوسازی خانه های بهداشت در اولویت قرار گرفته و با این اقدام جشن پایان محرومیت از نظر تامین پوشش کامل جمعیتی مراقبتهای اولیه بهداشتی برگزار گردد. در این راستا مقرر شد ۱۷۹ باب خانه بهداشت (با قدمت بسیار بالا/تخریبی) در سطح استان مورد احداث قرار گیرد که در زمان افتتاح ۱۸۳ باب خانه بهداشت احداث شدند و همزمان در جریان سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گرفتند. موضوع احداث واحد های ارائه خدمات روستایی و شهری و حاشیه شهرهای بزرگ همزمان با برنامه ریزی حضور ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت مجددا مطرح و در جلسات هیات رئیسه محترم دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و مقدمات احداث واحد های محدودی در دستور کار قرار گرفت و متعاقب آن تعداد واحد ها به یکصد باب افزایش و پس از جلب نظر استاندار محترم استان و وزیر محترم بهداشت و درمان، تفاهم نامه ای نیز تنظیم و آماده امضا شد. با اعلام حمایت استاندار محترم از فرآیند احداث ها و استقبال جناب آقای دکتر هاشمی از این امر موضوع با جدیت مورد اهتمام هردو حوزه معاونت دانشگاه (معاونت امور بهداشتی و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه) قرار گرفت و مقدمات کار با سرعت هرچه بیشتری فراهم شد. بطوری که در کمتر از یک ماه کلیه هماهنگی های بین بخشی انجام و امورات فنی مورد پیگیری جدی قرار گرفت. به منظور انسجام بخشی در فرآیند احداث ها کمیته ای در ستاد دانشگاه شکل گرفت و کلیه مسائل در کمیته دانشگاهی با تشریک مساعی و حل مشکلات بصورت مستمر و حتی هفتگی مورد پیگیری قرار گرفت. با گسترش تعداد واحد های احداثی به ۳۴۰ باب در ماه پایانی سال ۱۳۹۵ که با تلاش های ریاست محترم دانشگاه و پیگیری های مستقیم ایشان و موافقت وزیر محترم بهداشت درمان انجام گرفت، برنامه احداث واحد های بهداشتی وارد فاز جدیدی شد و خوشبختانه با مشارکت صمیمانه و خستگی ناپذیر بدنه مدیریتی-کارشناسی دانشگاه تاکنون بخوبی مورد اقدام قرار گرفته است. امید میرود با پیمان سپاری مانده واحد ها، مشکل نظام سلامت استان از نظر فضای فیزیکی واحد های ارائه خدمات مراقبتهای اولیه سلامت تا سالهای متمادی رفع گردد و ضمن بهره برداری لازم از این فضاهای به روز و مدرن در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت احاد جامعه استان، مقوله بهبود استاندارد (نگهداری و تعمیر) این مستحدثات نیز وجهه همت مدیریت شهرستان

قرار گیرد که یقیناً ضمن صرفه جوئی در منابع؛ بهبود کیفیت خدمات؛ افزایش انگیزه ارائه کنندگان خدمات را بدنبال خواهد داشت.

روند اجرای پروژه های عمرانی از ابتدای شروع مطالعات امکان سنجی تا احداث و راه اندازی اولیه دارای مراحل مختلفی است که این مجموعه سعی دارد خلاصه ای از روند استاتیک اجرای پروژه ها را بصورت خلاصه مستند نماید (بررسی سیر تکوین و تحقق طرح عمرانی از زمان پیدایش تا مرحله مطالعه و اجرا و بهره برداری و نگهداری براساس بخشنامه ۲۰۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).

واحد های احداثی حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در قالب طرح تحول سلامت بالغ بر ۵۳۳ پروژه است که بدنبال بهبود استاندارد فضاهای فیزیکی ۲۴۸ خانه بهداشت و ۱۰۱ مرکز بهداشتی درمانی روستایی و بیش از ۸۰ باب زیست پزشک (در طی سالهای ۹۵-۱۳۹۳) مورد اهتمام نظام سلامت استان قرار گرفته است که نقش به سزایی در تامین رضایت خاطر ارائه کنندگان خدمت و کیفیت خدمات و ارتقای سلامت مردم شریف استان در اقصی نقاط روستایی- شهری و حاشیه شهرها خواهد داشت. ۵۳۳ پروژه گزارش شده در این مجموعه مشتمل بر ۱۸۳ خانه بهداشت افتتاحی و تامین مقدمات احداث ۳۵۰ پروژه در سفر پرخیر و برکت جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استان آذربایجان غربی است که مبتنی بر شرح کلی شکل گیری برنامه احداث، اجزای متشکله هر واحد اعم از پایگاه سلامت، خانه بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و مستندات استاتیکی مستحدثات و اسامی واحد های احداثی به تفکیک شهرستانهای تابعه میباشد.

تلاشهای شبانه روزی و زحمات کلیه همکاران ستادی دانشگاه بویژه مدیران و کارشناسان ادارات فنی و ساختمان، بودجه، مالی، گسترش شبکه و مدیران محترم شبکه های بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستان و سایر همکاران محیطی را در این خصوص ارج نهاده، مزید توفیقات این عزیزان در خدمت صادقانه و خالصانه به مردم محروم در اقصی نقاط روستایی و شهری استان را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینماید.

معاونت امور بهداشتی دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ضرورت های اجرای برنامه های عمرانی در حوزه بهداشت

حوزه بهداشت عمومی در استان دارای بیش از ۱۲۵۰ ساختمان با توزیع در بیش از یک هزار روستای استان و نقاط شهری است و بصورت روزانه به جمعیت سراسر استان بیش از یکصد خدمت مراقبت های اولیه بهداشتی را ارائه مینماید و روز به روز برتنوع و گستره خدمات افزوده میشود و لازمه این خدمات تامین فضای فیزیکی متناسب با شان مردم (از نظر ساختار و معماری) و نوع خدمات (فضای فیزیکی) با رعایت شرایط استاندارد و قانونی از جمله طرح انطباق خدمات با موازین شرع مقدس میباشد.

نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی بخصوص در مناطق روستایی دارای قدیمی ترین واحد های ارائه خدمات در کشور است و اولین استان کشور در راه اندازی آزمایشی نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در سال ۱۳۵۳ میباشد که به تبع آن فرسوده ترین ساختمانهای عرصه سلامت کشور متعلق به این استان (با قدمتی بالای ۶۰ سال) بود. این ساختمانها از زمان احداث در طی حدود ۵۰ سال فقط مورد بهبود استاندارد و مرمت های جزئی قرار میگرفتند و هزار چندگاهی یک مورد نوسازی میشد. در دهه ۸۰ شمسی نیز با اعتبارات بانک جهانی بخشی از فضاهای فیزیکی مورد احداث قرار گرفته بودند (۲۷ مرکز بهداشتی درمانی روستایی) و فرسودگی ساختمانهای اداری ارائه خدمات بخصوص در مناطق روستایی در میان بافت نوسازی شده روستایی چهره خوبی در ذهن بیننده و گیرندگان خدمات و کارکنان نظام سلامت بر جای نمیگذاشت. در ارزیابی کیفی ساختمانها براساس ایمنی سازه ای نیز که در سال ۱۳۹۴ انجام گرفته بود، این شاخص در استان ۱۵ بود که در مقایسه با میانگین کشوری (۲۱) بسیار نازل مینمود. بنابر این جهت ارتقای توانمندی و تاب آوری نظام سلامت در برابر مخاطرات نیز امر نوسازی واحد ها بسیار حیاتی بنظر میرسید. در پایان سال ۱۳۹۴ وضعیت ساختمانی واحد های ارائه خدمات بهداشتی درمانی به شرح زیر بود:

ملکی	خانه بهداشت/پایگاه سلامت روستایی	مرکز بهداشتی درمانی روستایی	پایگاه سلامت شهری	مرکز بهداشتی درمانی شهری/روستایی	مرکز بهداشتی درمانی شهری
۸۵۵	۱۰۷	۲۴	۴۷	۲۸	
۱۱۶	۵	۳۴	۶	۶	
۲۶	۳	۶	۲	۴	

بدنبال بازنگری های انجام گرفته در ساختار تشکیلاتی نظام ارائه خدمات شهری و روستایی استان در طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، تعداد واحد های ارائه خدمات از ۱۲۶۹ واحد به ۱۴۳۷ واحد (با راه اندازی در فضاهای استیجاری یا استقرار موقت افزایش پیدا کرد. با توجه به ضرورت راه اندازی این واحد ها در مناطق شهری بخصوص در طی سال ۹۴، تعداد واحد های مورد نیاز برای جایگزینی واحد های استیجاری/استقرار موقت از ۲۰۸ به ۳۷۶ واحد افزایش یافت که اگر به این فهرست واحد های با قدمت ساخت ۳۰ سال هم اضافه گردد لیست بلند بالایی را تشکیل خواهد داد. بر همین اساس با احداث واحد های مذکور بخش اعظم نیاز های ساختمانی واحد های ارائه خدمات تامین میگردد. در زیر تصاویر برخی از واحد های فرسوده که در دست احداث قرار گرفته اند درج شده است.

تصاویری از واحدهای فرسوده و قدیمی



روند احداث ۱۸۳ خانه بهداشت

خانه های بهداشت اولین سطح تماس مردم مناطق روستایی با نظام سلامت بوده و روزانه به هم میهنان روستایی خدمات گسترده مراقبتی را به گروههای سنی مختلف ارائه مینماید. در راستای طرح تکمیل گسترش شبکه های بهداشتی درمانی اولین مرحله از این طرح به احداث خانه های بهداشت اختصاص پیدا کرد. براساس تفاهمات انجام شده فیما بین وزارت متبوع، مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی(ره) مبنی بر تکمیل خانه های بهداشت مورد نیاز طرح گسترش شبکه جهت برگزاری جشن پایان محرومیت مقرر گردید این طرح با اولویت احداث خانه های بهداشت فاقد ساختمان/ دارای ساختمان استیجاری/ دارای ساختمانهای فرسوده با قدمت ۲۵ سال در دست اقدام قرار گیرد. در این طرح مقرر بود ۱۹۵۵ خانه بهداشت در کشور احداث گردد که ۱۰ درصد از این واحدها اختصاص به آذربایجان غربی داشت(دومین استان در کشور پس از کرمان)، این درحالی است که فقط ۵درصد خانه های بهداشت کشور در استان آذربایجان غربی استقرار دارند.

بدنبال ارزیابی های محیطی انجام گرفته در زمستان سال ۱۳۹۲، مقدمات احداث ۱۷۹ باب خانه بهداشت در بهار ۱۳۹۳ فراهم و در دست اقدام قرار گرفت. براساس هماهنگی انجام گرفته در سطح ملی، مقرر بود بخشی از هزینه های احداث خانه های بهداشت با مشارکت کمیته امداد انجام گیرد که نه تنها این مشارکت شکل نگرفت بلکه فرآیند ساخت خانه های بهداشت را از نظر زمانی با چالش جدی مواجه ساخت. این امر خوشبختانه با مسئولیت پذیری، تدابیر ویژه و مداخلات به موقع ریاست دانشگاه و تلاش شبانه روزی زیر مجموعه های معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت امور بهداشتی دانشگاه و همکاری همه جانبه مدیریت شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه شکل عملیاتی پیدا کرد و در کمتر از یک سال تعداد ۱۸۳ باب خانه بهداشت در زیربنایی به مساحت ۱۳۳۵۳ مترمربع احداث و آماده بهره برداری شد و این واحدها براساس آخرین دستورالعمل ابلاغی تجهیز نیز گردیدند.

تصاویری از خانه های بهداشت قدیمی و تخریبی



خانه های بهداشت احداث شده به تفکیک شهرستان - استان آذربایجان غربی ۱۳۹۴

شهرستان	خانه بهداشت	زیر بنا
ارومیه	المان آباد-دیزج دول-عسگر آباد تپه-گردآباد-دیدان سفلی-دیزج تکیه-رازان ۲- ساری بیگلوی چراغ-ساعتلوی کوه (باراندوز)-جوجهی-طوطی آباد-سرو-قصریک-قلعه اسماعیل آقا-کانی رش-کفسی-نوشین-لور-محمودآباد-ملونه-ناری-آغ چقال-آغچه قلعه-پیرانجوق-تبت-جانویسلو-جلقران-جوهنی-چریک آباد-نوشان-هفت ساران-هورسین-ینگجه-یورقون آباد سفلی-آشناآباد-میرشکارلو-الیاس آباد-عسگر آباد کوه-کردلر-قره آغاج-نیولو-باراندوز-حیدرلوی بیگلر-ساعتلو (بالانج)-منصورآباد-ریحان آباد-نوی-کوران (موانا)	۳۶۳۰ مترمربع
اشنویه	آغ بلاغ	۷۰ مترمربع
بوکان	ناچیت-ینگجه-اسکی بغداد-سردکوهستان-یکشوه-لگز-پاشبلاغ-حاجی لک-ساریقامیش آختاچی-سلامت-قره گل-غوٹ آباد	۸۶۰ مترمربع
پلدشت	پبله سوار-دیوانخانه-میلادشهر-بهلول کندی-کینه کور-قره خوجالو	۴۲۰ مترمربع
پیرانشهر	ترکش سفلی-کوپر-گرده بن-هنگ آباد-کارخانه قند	۳۵۰ مترمربع
تکاب	سبیل*-قلدره*-عربشاه گروس-قیزقپان-قینرجه	۳۷۰ مترمربع
چالدران	قرل بلاغ	۷۰ مترمربع
چاپاره	شیرین بلاغ-بسطام-کوروش-بادکی-زنگلان سفلی	۳۷۰ مترمربع
خوی	آغشلو-بلسورسفلی-بلسورعلیا-بیلوار-پیرموسی-چاوش گلی-چکمه زر-دیزج الندا-شیرین کندی-عزت آباد-مهلذان-کرتای-کردنشین-بدل آباد-ولدیان-سعیدآباد-مراکان-اگریوجاق-سیه باز-قوردیک-دیزج دیز-آلمالی-تپه باشی ابوالغلی-زری قریس-قرلجه-میر عمر-رازی-کتوان آباد	۲۰۴۰ مترمربع
سردشت	کانی زرد-بیوران علیا	۱۴۰ مترمربع
سلماس	چهارستون-چهریق علیا-حبشی-کنگرلو-کومشک-گولان-ملهم ۲-میناس-هفتوان ۲-چیچک-زیندشت-شکریازی-کلشان-اولق-باغچه جیق-سنجی-صدقیان-قره قشلاق-گلعدان-مغانجوق-وردان-استون رش-دوستان-هشتراک	۱۸۵۳
شاهیندژ	آغاجاری-خلوت-ساروجه علیا-سانجود-صفاخانه-ظاهر کندی-فتح آباد-گوزل بلاغ-هاچه سو-هولاسو-سعیدآباد	۸۱۰ مترمربع
شوط	یولاگلدی-خوک	۱۶۰ مترمربع
ماکو	بهلوله-پنجرلو-علوحاجی-قوری شکاک-قره تپه	۳۷۰ مترمربع
مهاباد	ایگریقاش ۲-قچی آباد-کانی سیب-قرل قویی-کوئر-قویی باباعلی	۴۴۰ مترمربع
میاندواب	تازه کند للکلو-چالخانماز-قره تپه-ولی آباد-ابراهیم حصاری-ارمناک سفلی-تک آغاج-جعفرآباد-حاجی کند-زاغه-سبزی-قرمزخلیفه سفلی-قره سقال-کوخان-گوی تپه خالصه ۲-گویجه علی-ملک آباد-باریجان خالصه-شکور کندی-آیدیشه	۱۴۰۰ مترمربع


تصاویری از خانه های بهداشت احداثی جدید با تجهیزات





روند شکل گیری احداث ۳۵۰ واحد خدمات بهداشتی درمانی

همزمان با سفر رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و هیات محترم دولت به استان در دهم خرداد ماه سال ۱۳۹۵، موضوع احداث واحد های بهداشتی درمانی با توجه به فرسودگی ساختمان های مذکور و تغییرات ایجاد در تشکیلات سازمانی و ساختاری نظام شبکه ارائه خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی در حاشیه شهرها، شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت و مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت که یکی از دغدغه های نظام سلامت استان بود، در دستور کار قرار گرفت و با جلب نظر مقام محترم وزارت تفاهم نامه ای تنظیم و پس از امضای سه جانبه (مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مقام عالی استان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی) وارد فاز اجرایی شد. در این تفاهم نامه ۳۴۰ واحد ارائه خدمات و سایر ساختمان های مورد نیاز مرکز بهداشت شهرستان های تابعه پیش بینی شده است، علاوه بر این تعداد ۱۰ پروژه عمرانی نیز از محل منابع مناطق محروم از اواخر سال ۱۳۹۴ در دست احداث قرار گرفته است و مجموعاً ۳۵۰ پروژه را شامل می گردد.

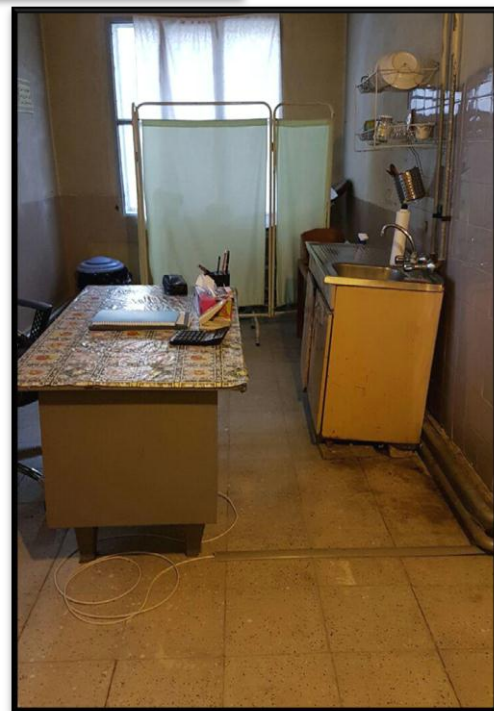

تفاهم نامه منعقدده سه جانبه احداث ۳۴۰ واحد بهداشتی درمانی

بسمه تعالی

«اصلاحیه تفاهم نامه»

در سفر پرخیز و برکت زیاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیات محترم دولت به استان آذربایجان غربی و پیرو اجرای طرح های ارزشمند تحول نظام سلامت و اجرای موفقیت آمیز پروژه احداث و تجهیز ۱۸۰ خانه بهداشت در آذربایجان غربی، هم اینک احداث ۳۴۰ واحد ارائه خدمات بهداشتی دارای اولویت استیجاری و یا با قدمت بالای ۲۵ سال در سال ۱۳۹۵ در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. به منظور مشخص نمودن تعهدات هریک از نهادهای موثر در احداث این واحدها (مرکز خدمات جامع سلامت شهری/ روستایی / پایگاه سلامت شهری/ مرکز آموزش بهداشت/ شبکه بهداشت و درمان شهرستان/ محل زیست پزشک/ تسهیلات زیربنایی) خانه بهداشت آزمایشگاه ستادی/ اورژانس (۱۱۵) به شرح جدول تفکیکی در شهرستانهای تابعه استان تفاهم نامه زیر منعقد میگردد.

شهرستان	تعداد پایگاه سلامت	تعداد مرکز آموزش بهداشت	تعداد ستاد شبکه و مرکز بهداشت	تسهیلات زیربنایی	تعداد مرکز سلامت شهری	تعداد مرکز سلامت روستایی	محل زیست پزشک	خانه بهداشت	آزمایشگاه ستاد مرکزی	اورژانس ۱۱۵	جمع
اردبیل	۳۶	۱		۱	۲۲	۱۳	۱۳	۴۰	۳	۳	۱۲۰
اشنویه	۲				۲	۱	۱	۳			۸
بوکان	۶				۴	۳	۳	۳			۱۶
پلدشت		۱				۳	۳	۱	۱		۱۰
پیرانشهر	۴				۲			۲			۸
تکاب	۲				۱	۱	۱		۱		۶
سردشت	۱			۲	۱	۲	۲	۲			۱۰
سلماس	۴	۱			۴	۳	۳	۶			۲۱
شاهیندژ	۲				۲	۲	۲	۱	۱		۱۰
شوش	۱		۱		۱	۲	۲	۵			۱۲
چابکده	۱		۱		۱	۱	۱	۳	۱		۸
چابکده	۱		۱		۱			۲	۱		۶
خوی	۸		۲		۵	۷	۷	۷	۱	۱	۳۸
ماکو	۲	۱	۱		۱	۱	۱	۵			۱۲
میاندوآب	۳				۴	۳	۳	۳	۱		۱۹
نقده	۲				۳	۴	۴	۲	۱		۱۶
جمع	۷۳	۳	۵	۵	۶۰	۴۸	۵۲	۸۰	۱۱	۳	۳۴۰

تعهدات امضاء کنندگان تفاهم نامه:

- ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تقبل تامین ۶۰ درصد از کل هزینه احداث و یا خرید
- ۲- استانداری آذربایجان غربی با تقبل تامین رایگان زمین در مناطق شهری و ۱۵ درصد هزینه احداث
- ۳- دانشگاه علوم پزشکی با تقبل تامین ۲۵ درصد از کل هزینه احداث و یا خرید و مدیریت برنامه ریزی و احداث واحدهای فوق تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۶ و آماده سازی برای افتتاح در سالگرد سفر هیات دولت به استان

دکتر هاشمی
وزیر بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی

سعادت
استاندار
آذربایجان غربی

دکتر جواد آقازاده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

در اولین قدم با پیشنهاد دکتر آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی به جناب آقای سعادت استاندار محترم در مورخه ۱۳۹۵/۳/۲۵ ستاد استانی احداث پروژه های هدف با ترکیب زیر تشکیل گردید:

- ۱- استاندار (رئیس ستاد احداث)
- ۲- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار (جناب آقای مهندس کهوریان) (جانشین رئیس ستاد)
- ۳- مدیر کل راه و شهرسازی استان (جناب آقای مهندس نصر)
- ۴- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (جناب آقای حضرتی)
- ۵- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اذربایجان غربی (جناب آقای دکتر آقازاده) (دبیر ستاد استانی)
- ۶- رئیس شورای اسلامی استان (جناب آقای اصغرزاده)
- ۷- شهردار کلان شهر ارومیه (جناب آقای حضرت پور)

اولین جلسه ستاد استانی احداث پروژه های عمرانی حوزه بهداشت در مورخه ۱۳۹۵/۴/۶ تشکیل و ضمن تبیین ضرورت و اهمیت پروژه ها در خصوص روند اجرایی موارد ذیل تصویب و مصوبات طی نامه شماره ۶/۹۵/۱۷۶۳۳۷ پ مورخه ۱۳۹۵/۴/۹ توسط دبیرخانه ستاد به مراجع ذیربط ابلاغ گردید:

الف) همکاری اداره کل راه و شهرسازی در معرفی زمین های با کاربری بهداشتی در شهرستانهای تابعه و مساعدت در تغییر کاربری فضاهای موجود در صورت عدم وجود زمین مناسب به کاربری بهداشتی و تحویل به دانشگاه علوم پزشکی

ب) همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در جلب مشارکت فرمانداران جهت همکاری با شبکه های بهداشت و درمان در تامین زمین و جانمایی واحد های احداثی

ج) همکاری شهرداری ها در تحویل زمین و تسهیل و تسریع صدور پروانه ساختمانی رایگان

د) اولویت بندی پروژه ها جهت احداث به ترتیب واحد های استیجاری/ دارای زمین با کاربری بهداشتی

د) تامین اعتبار مورد نیاز براساس تفاهم نامه در سقف ۱۵ درصد سهم استانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

در همین زمینه مکاتبات/اقدامات لازم از سوی ادارات کل عضو ستاد استانی با مراجع متناظر شهرستانی از جمله مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای طی نامه شماره ۱۴/۹۵/۷۲۴۳ مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۴ ، نامه شماره ۹۵/۱۱۹/۲۲۰۵ مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۰ مدیریت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی انجام و شوراهای اسلامی شهرهای تابعه نیز در خصوص تامین رایگان زمین و پروانه ساختمانی به یاری نظام سلامت آمدند. این روند در سال ۹۶ نیز تداوم یافت و مصوبات اولین جلسه ستاد استانی احداث ۳۴۰ واحد بهداشتی در ۱۲ / ۲ / ۹۶ توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری طی شماره ۲۴۲۲۳ / ۹۶ / ۱۴ مورخه ۹۶/۲/۲۴ به فرمانداران، شهرداران شهر های ۴۲ گانه و روسای شوراهای اسلامی شهر های ۴۲ گانه استان جهت واگذاری زمین رایگان و صدور پروانه ساختمانی رایگان ابلاغ گردید.

با توجه به قرار گیری چهار شهرستان شمالی استان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو و به منظور بهره برداری از پتانسیل های منطقه تفاهم نامه ای فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو در مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۸ منعقد و پس از امضا بالاترین مقام اجرایی دو دستگاه طی نامه شماره ۸۶۷۴۲ مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۸ مورد اقدام قرار گرفت.

تفاهم نامه

این تفاهم نامه بین سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو به نمایندگی آقای حسین فروزان به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره به نشانی: منطقه آزاد ماکو - بازرگان، کیلومتر یک جاده بین المللی بازرگان - ماکو که منبعه به اختصار «سازمان» نامیده می شود از یک طرف و دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی به نمایندگی آقایان: ۱- دکتر جواد آقازاده، بعنوان رئیس دانشگاه به نشانی: ارومیه - بلوار رسالت - کوی اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه که منبعه به اختصار «دانشگاه علوم پزشکی» نامیده می شود از طرف دیگر به امضاء رسید.

ماده یک: «موضوع تفاهم نامه»

نظر به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور توسعه خدمات بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری درصدد احداث ساختمانهایی بعنوان پایگاه سلامت یا مرکز سلامت در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد ماکو (شهرهای ماکو، پلدشت و بازرگان) می باشد لذا حسب درخواست دانشگاه علوم پزشکی، مقرر گردید، سازمان از اراضی دولتی در اختیار خود قطعاتی را شناسائی و با شرایط سهل جهت احداث ساختمان این مراکز تخصیص دهد.

ماده دوم: «مدت تفاهم نامه»

این تفاهم نامه تا آخر سال ۱۳۹۶ معتبر می باشد. بدین توضیح که در صورت ارائه مستندات معتبر از سوی دانشگاه علوم پزشکی که دلالت بر تامین اعتبار مورد نیاز جهت احداث ساختمان این مراکز داشته باشد، سازمان درخصوص تامین عرصه مورد نیاز (متناسب با ساختمان هریک از مراکز و اعتبار مصوب) همکاری لازم بعمل خواهد آورد. به عبارت دیگر به موجب این تفاهم نامه مقرر گردید زمین مورد نیاز از طرف سازمان تامین و احداث ساختمان و تجهیز مراکز بعهد دانشگاه علوم پزشکی باشد.



به منظور تسريع و تسهيل در تامين زمين هاى مورد نياز، ضمن مكاتبه اوليه طى نامه شماره ۶۴۶۷۸/۰۵/۹۵/۶/پ مورخه ۱۳۹۵/۳/۱۹ جلسات هماهنگى با مديريت شبكه هاى بهداشت و درمان شهرستانهاى تابعه تشكيل و اقدامات مورد انتظار (تاييد نهايى واحد هاى مورد احداث، تعيين مرجع تامين زمين و روند پيگيرى، روند اخذ مجوز تخریب و....) مصوب و مورد اقدام و پيگيرى قرار ميگرفت.

به موازات پيشرفت هماهنگى هاى بين بخشى، ستاد دانشگاهى احداث ها با مشاركت قائم مقام رياست دانشگاه در امور شبكه هاى بهداشت و درمان شهرستانهاى تابعه، معاون توسعه مديريت و منابع، معاون امور بهداشتى، مديريت توسعه و تامين منابع فزيكى و امور عمرانى نيز تشكيل و ضمن بررسى ابعاد موضوع با توجه به گستردگى و تنوع واحد هاى احداثى در اقصى نقاط استان نسبت به نحوه مديريت احداث پروژه ها و كيفيت فنى مستحداثات، طراحى تفصيلى و اجرايى، انجام مناقصه و انتخاب مشاور و پيمانكاران و تصميم گيرى مينمود.

متعاقب مذاكرات و پيگيرى هاى رياست دانشگاه علوم پزشكى از جناب اقاي دكتر هاشمى وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكى جدول احداث مورد تفاهم مورد اصلاح قرار گرفت و با حمايت هاى جناب اقاي سعادت و قول مساعد مقامعالى وزارت، تعداد واحد هاى احداثى به ۳۴۰ واحد افزايش يافت و در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در قالب تفاهم سه جانبه امضا و تبادل گرديد. در راستاى اين تفاهم نامه عليرغم اينكه واحد هاى ارائه خدمات بهداشتى درمانى (اعم از خانه هاى بهداشت، مراكز بهداشتى درمانى) قدمت بسيار بالايى داشتند در دست اقدام قرار گرفته و كلا نوسازى خواهند شد. در اين زمينه بدنبال بازنگرى هاى انجام گرفته در مناطق شهرى، روستايى و حاشيه شهرهاى بزرگ و تصويب واحد هاى جديد، بخشى از اين واحد ها نيز در دستور احداث قرار گرفتند.

جدول زير خلاصه اطلاعات واحد هاى احداثى براساس تفاهم نامه ۳۴۰ واحدى را نشان ميدهد:

تعداد پايگاه سلامت	تعداد ستاد شبكه و مركز بهداشت	تسهيلات زايمانى	تعداد مركز سلامت شهرى	تعداد مركز سلامت روستايى	محل زيست پزشك	خانه بهداشت	آزمائشگاه ستاد مركزى	اورژانس ۱۱۵	تعداد مركز آموزش بهورزى	جمع
۷۳	۵	۵	۶۰	۴۹	۵۲	۷۹	۱۱	۳	۳	۳۴۰

همانگونه كه ملاحظه ميگردد علاوه بر احداث ۲۸۰ واحد ارائه خدمات بهداشتى درمانى، ۵۲ محل زيست پزشك، ۳ باب مركز آموزش بهورزى، ۵ باب ساختمان ادارى شبكه هاى بهداشتى درمان شهرستانهاى ماكو (بدليل قدمت بسيار زياد)، پلدشت-چالدران-شوط-چايباره كه از زمان تشكيل شهرستان فاقد ساختمان بودند نيز در دستور احداث قرار گرفتند.

نحوه تامين منابع مالى احداث پروژه ها

حسب تعهدات مندرج در تفاهم نامه سه جانبه مقرر گردیده ۶۰ درصد از كل هزينه هاى احداث توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى، ۱۵ درصد از كل هزينه هاى احداث توسط استاندردى بانضمام تامين رايگان زمين و صدور پروانه ساختمانى رايگان و ۲۵ درصد نيز توسط دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى اذربايجان غربى تامين و پرداخت گردد. با توجه به استقبال خيرين سلامت در گستره استان در خصوص مشاركت در تامين زمين و يا احداث

ساختمانها و حسب تفاهم بعمل آمده با هیئت مدیره محترم شورای خیرین سلامت استان مقرر گردیده ۱۵ درصد از کل هزینه های مترتب بر احداث پروژه ها توسط خیرین سلامت تامین گردد.

تفاهم نامه منعقدہ با مجمع خیرین سلامت استان

شماره: ۲۲۷۹۱۱
تاریخ: ۱۳/۱۲/۳۹۵

بسمه تعالی

تفاهم نامه

پیرو سفر پر خیر و برکت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیئت محترم دولت به آذربایجان غربی در خرداد ماه سال جاری، تفاهم نامه احداث واحدهای ارائه خدمات بهداشتی قیامین وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار محترم آذربایجان غربی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی امضاء و پس از اصلاحیه های انجام گرفته (از جمله اسفند ماه سال ۱۳۹۵) و تعیین سهم مشارکت مالی ذینفعان ابلاغ گردید.

باتوجه به ضرورت مشارکت خیرین سلامت در فرآیند احداث واحدهای بهداشتی، این تفاهم نامه قیامین امضاء کنندگان ذیل به منظور تعیین سهم دانشگاه علوم پزشکی و مجمع خیرین سلامت استان از محل سهم ۲۵ درصدی دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل مورد توافق قرار می گیرد.

مجمع خیرین سلامت استان آذربایجان غربی متعهد میگردد در این امر خدایسندانه مشارکت خیرین سلامت را جلب و تامین ۱۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز کل موضوع تفاهم نامه را پیگیری نماید و دانشگاه علوم پزشکی نیز نسبت به تامین ۱۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز کل موضوع تفاهم نامه اقدام خواهد نمود.

دکتر جواد آقازاده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

دکتر علی تقی زاده افشاری
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین
سلامت آذربایجان غربی

دکتر عبدالعزیز حمیدی
مدیر عامل مجمع خیرین
سلامت آذربایجان غربی

روند مدیریت احداث پروژه ها در سطح شهرستان

حسب توافقات بعمل آمده با فرمانداران محترم شهرستانهای تابعه به عنوان مدیریت عالی شهرستان، مقرر گردیده ستاد شهرستانی احداث واحدهای بهداشتی با ریاست فرماندار و دبیری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و عضویت اعضای متناظر استانی تشکیل گردد. در همین زمینه پس از توافقات اولیه با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان، رئیس مرکز بهداشت و مسئول واحد گسترش شبکه شهرستان در خصوص واحدهای مورد احداث در قالب صورتجلسه تنظیمی، صورتجلسه ای که متضمن واحدهای پیش بینی شده برای احداث میباشد تهیه گردیده که ضمن احصاء مساحت کلی پروژه های مورد احداث، سهم مالی متعهدین برآورد و مراتب به تایید فرماندار محترم، رئیس شورای خیرین سلامت و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رسیده و مورد اقدام و پیگیری قرار گرفته است. در این زمینه رئیس شورای خیرین سلامت شهرستان نیز پیگیر تامین منابع مالی وفق تفاهم بعمل آمده از محل پتانسیل های مردمی خواهند بود.

بسمه تعالی

صور تجلسه اولویت بندی و احداث واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان

پیرو امضا تفاهم نامه منعقد سه جانبه (وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی / استاندار محترم / ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی) مبنی بر احداث ۳۴۰ واحد بهداشتی در استان آذربایجان غربی جلسه ای با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل و پس از بحث و بررسی در خصوص اولویت بندی واحدهای بهداشتی (استیجاری / استقرار موقت / دارای مجوز تخریب از اداره کل راه و شهرسازی استان / قدمت ساختمان) مقرر شد احداث پروژه های بهداشتی زیر انجام گیرد.

ردیف	نام واحد بهداشتی	نوع مرکز			وضعیت ساختمان				مترای برآوردی	تیب ساختمان مورد نیاز
		شهری	روستایی	شهری روستایی	ملکی	استیجاری	استقرار موقت	قدمت ساختمان		
۱										
۲										
۳										
۴										
۵										

تعهدات شهرستان:

- در اجرای مصوبات صورت جلسه مورخه ۱۳۹۵/۴/۶ ستاد استانی احداث واحدهای بهداشتی ونامه شماره ۱۴/۹۵/۷۲۴۳ مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۴ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری مقرر گردید ستاد احداث شهرستان به ریاست فرماندار محترم شهرستان و دبیری مدیر شبکه بهداشت ودرمان و شرکت شهردار، رئیس اداره راه و شهرسازی، رئیس شورای خیرین سلامت شهرستان، رئیس شورای اسلامی شهرستان تشکیل تا با هماهنگی سایر ادارات، زمین مورد نیاز و مناسب و بلامعارض برای پروژه ها تامین و جهت احداث در اختیار شبکه قرار گرفته و با هماهنگی شهرداری و دهیاران روستاها نسبت به صدور پروانه ساختمان رایگان اقدام گردد.
- مسئولیت بررسی و تایید موقعیت مکانی زمینها از نظر شرایط فیزیکی و دسترسی جمعیت تحت پوشش برای دریافت خدمات بهداشتی برعهده شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میباشد.
- شورای خیرین سلامت شهرستان متعهد می گردد با هماهنگی مراجع ذی صلاح شهرستان نسبت به جلب همکاری و مشارکت افراد خیر در احداث پروژه ها به منظور تامین سهم ۱۵ درصدی خیرین براساس تفاهم نامه شماره ۲۲۷۹۱۱ مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ رئیس محترم هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت آذربایجان غربی با ریاست محترم دانشگاه اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

فرماندار شهرستان

رئیس شورای خیرین سلامت شهرستان

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان

نحوه تامین زمین جهت احداث واحد های ارائه خدمات

تامین زمین اولین مرحله از روند احداث ساختمان میباشد. تامین زمین در مناطق روستایی ضمن استقبال از طرف روستائیان ، از طریق شوراهای اسلامی روستایی و اهالی روستا کارسازی و در اختیار مرکز بهداشت شهرستان قرار میگیرد. پس از بررسی های اولیه توسط واحد گسترش شبکه، هماهنگی با دفتر فنی دانشگاه انجام و توسط ناظران فنی دفتر مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته و در صورت تایید نسبت به هماهنگی های اداری و تنظیم صورتجلسات نسبت به تملک زمین و پیگیری امورات اداری ثبتی اقدام میگردد.

در مناطق شهری تامین زمین مشکل بوده و از پیچیدگی های خاصی نیز برخوردار میباشد. زمین ها ضمن اینکه بایستی در محدوده جغرافیایی تعیین شده قرار داشته باشند از نکته نظرات سهولت دسترسی، مجاورت با سایر خدمات شهری و شهرسازی و معماری نیز مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار می گیرند.

زمین های مورد نظر در طرح تحول سلامت براساس مصوبات ستاد استانی و حمایت های همه جانبه مدیریت شهری از جمله فرمانداری، شهرداری و اداره راه و شهرسازی و شورای اسلامی شهر و خیرین تامین و در اختیار شبکه های بهداشت و درمان شهرستان قرار گرفت. جدول صفحه بعد توزیع منابع تامین کننده زمین های مورد احداث (۱۶۲) در مناطق شهری و روستایی استان تا پایان سال ۱۳۹۵ را نشان میدهد:

جدول توزیع منابع تامین کننده زمین های مورد نیاز جهت احداث واحد های بهداشتی در مناطق شهری و

روستایی استان آذربایجان غربی – پایان سال ۱۳۹۵

شهرستان	شهرداری	اداره راه و شهرداری	خیرین سلامت	ملکی	سایر	جمع
ارومیه	۱۵	۴	۲	۳۴	-	۵۵
اشنویه	۰	۱	۰	۲		۳
بوکان	۱	۱	۰	۵		۷
پلدشت	۰	۰	۲	۰	(۲) سازمان منطقه آزاد ماکو	۴
پیرانشهر	۰	۰	۰	۵		۵
تکاب	۰	۱	۱	۲		۴
چالدران	۰	۰	۰	۴		۴
چاپاره	۱	۰	۰	۳		۴
خوی	۵	۰	۰	۶	(۱) نگارخانه	۱۲
سردشت	۰	۰	۰	۴		۴
سلماس	۱	۲	۲	۵		۱۰
شاهین دژ	۰	۱	۰	۴		۵
شوط	۱	۰	۰	۷	(۱) سازمان منطقه آزاد ماکو	۹
ماکو	۰	۰	۲	۵	(۲) سازمان منطقه آزاد ماکو	۹
مهاباد	۰	۴	۳	۱	(۱) اداره کل اوقاف	۹
میاندوآب	۲	۲	۰	۶	(۱) نگارخانه	۱۱
نقده	۰	۰	۱	۷	(۱) نگارخانه	۹
جمع	۲۶	۱۶	۱۳	۱۰۰	۹	۱۶۴

مرحله بندی احداث واحد های ارائه خدمات

توزیع واحد های هدف و روند احداث واحد های بهداشتی در دوفاز زمانی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بشرح زیر قابل تفکیک میباشند:

الف) فاز اول : واحد هایی که تا پایان سال ۱۳۹۵ پیمان سپاری شده اند

این واحد ها مجموعاً ۱۳۷ پروژه را شامل میشود و خود به سه بخش مجزا قابل تقسیم میباشند.

بخش اول: مشتمل بر ۲۵ واحد خدماتی - رفاهی (زیست پزشکی) است که تحویل گردیده و در ادامه اطلاعات تفصیلی در جداول مربوطه به تفکیک شهرستان درج شده است.

بخش دوم: مشتمل بر ۴ واحد روستایی و ۸ پروژه با مشخصات زیر که منابع آن از محل اعتبارات مناطق محروم تامین گردیده است (دو پروژه هورسین به اتمام رسیده و در بخش اول لحاظ شده است) :
کامل آباد (چاپاره) : یک مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و یک زیست پزشکی
بریسو (سردشت): یک مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و یک زیست پزشکی^۱
بند (ارومیه): یک مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و یک زیست پزشکی
کوره کانی(بوکان): یک مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و یک زیست پزشکی

بخش سوم مشتمل بر واحد هایی است که پیمان سپاری شده و در دست احداث قرار دارد. جداول تفصیلی به تفکیک شهرستان در ادامه ذکر شده است.

ب) فاز دوم: واحد هایی که تا پایان سال ۱۳۹۵ امکان پیمان سپاری فراهم نگردید و مقرر است در سال ۱۳۹۶

پیگیری گردد.

توزیع پراکندگی این واحد ها نیز در سراسر استان بوده و بخشی از این واحد ها نیز شامل واحد های جدید روستایی میباشند که در بازنگری سال ۱۳۹۵ مورد تصویب تیم کارشناسی وزارت متبوع قرار گرفته است. خلاصه اطلاعات این پروژه ها به تفکیک شهرستان بشرح زیر بوده و عناوین واحد های هدف در جدول صفحات بعدی درج گردیده است.

^۱ این پروژه علیرغم پیمان سپاری، بدلائیل محیطی متوقف شده است

شهرستان	واحدهای هدف	شهرستان	واحدهای هدف
ارومیه	۶۷	سردشت	۸
اشنویه	۷	سلماس	۹
بوکان	۷	شاهیندژ	۶
پلدشت	۵	شوط	۴
پیرانشهر	۷	ماکو	۱۰
تکاب	۶	مهاباد	۱۴
چالدران	۵	میاندواب	۱۴
چاپاره	۳	نقده	۸
خوی	۳۳	جمع	۲۱۳

در زیر عناوین مهم اقدامات بعمل آمده در راستای احداث پروژه ها ذکر میگردند:

(۱) مشخصات فنی پروژه ها :

مقرر گردید ساختمانهای مراکز خدمات جامع سلامت در مناطق شهری در یک تیپ کلاسیک به نحوی که مشخصه های لازم از لحاظ فرم و متریک استفاده شده معرف مراکز خدمات جامع باشد و بر اساس مسائل اقلیمی، جمعیت هدف از جمله سالمندان و مادران باردار، پدافند غیر عامل طراحی شده است. ساختمان ها در مناطق روستایی در دو تیپ کلاسیک و ویژه احداث می گردد. برهمین اساس واحد های احداثی تیپ بندی و حسب مورد با تایید شبکه بهداشت و درمان ذیربط، معاونت امور بهداشتی مورد اقدام دفتر فنی دانشگاه قرار گرفتند. نقشه معماری واحد های احداثی پس از بررسی های فنی و لحاظ شدن آنها با معماری و مبلمان شهری مورد تصویب ریاست دانشگاه، استاندار محترم و مقام عالی وزارت قرار گرفت.

(الف) مشخصات معماری در طراحی و اجرای پروژه ها

طراحی تمامی نیاز ها و فضا های مورد نیاز با رعایت استاندارد های لازم و حداقل فضا، متریک دیوار های خارجی و داخلی آجر سفال، عایق حرارتی سقف یونولیت، متریک کف سنگ در فضا های عمومی، متریک سرامیک پرسلان در داخل فضا ها، متریک نازک کاری داخل فضا ها بسته به کاربری فضا، سرامیک یا گچ و خاک، نمای بیرونی سنگ تراورتن و آجر پلاک به صورت ترکیبی، پنجره ها UPVC با شیشه های دوجداره آرگون دار با چهارچوب فلزی، درب های خارجی فلزی با شیشه، درب های داخلی HDF، متریک پله ها، سنگ، نرده الومینیومی در پله های ارتباطی، فلاشینگ فلزی در دوربام، کمدهای دیواری و کابینت و کانتر پذیرش MDF، سقف کاذب کناف در فضاهای مورد نیاز، نرده فلزی در طبقات اول و دوم در پنجره ها

ب) مشخصات سازه پروژه ها:

سازه با توجه به نوع کاربری بهداشتی اسکلت بتنی بصورت قاب خمشی ویژه، طراحی و اجرا میگردد. سیستم سقف سازه بصورت تیرچه با بلوک های سفالی، جداگرهای پیرامونی و داخلی با استفاده از دیوارهای به ضخام ۱۰ و ۲۰ برای دیوارهای بیرونی با رعایت استانداردهای آیین نامه، دیوارها با استفاده از نبشی ها جهت مهاربندی دیوارها استفاده شده است.

ج) مشخصات تاسیسات مکانیکی:

تاسیسات گرمایشی بصورت مرکزی با مشعل دوگانه سوز، لوله های استفاده شده بصورت پنج لایه Pex Al Pex، شیرآلات اهرمی، رادیاتور آلومینیومی، سیستم سرمایش، کولرآبی سلولزی با عایق بندی کانالهای کولر

د) مشخصات تاسیسات الکتریکی

اجرای سیستم ارت، سیستم اعلام حریق، شبکه کامپیوتری، طراحی روشنایی های موردنیاز



۲) تیپ بندی واحدها

مقرر گردید متراژ و نقشه ساختمانی پایگاه سلامت و مرکز خدمات جامع سلامت بشرح زیر تیپ بندی و مورد اقدام قرار گیرند:

الف) پایگاه سلامت

یک تیپ با مساحت زیر بنای ۲۵۰ متر مربع

ب) مرکز خدمات جامع سلامت روستایی

A- مراکز خدمات جامع سلامت روستائی: ۵۸۰ متر مربع

- B- مراکز خدمات جامع سلامت روستائی که استقرار پایگاه فوریت ها(۱۱۵) پیش بینی شده باشد: ۷۳۰ متر مربع

- C- مراکز خدمات جامع سلامت روستائی با استقرار پایگاه فوریت ها(۱۱۵) و با موقعیت خاص جغرافیایی(جاده/محل تلاقی بین

شهری، با تردد خودروئی سنگین): ۸۰۰ متر مربع

- D- مراکز خدمات جامع سلامت روستائی با موقعیت خاص جغرافیایی(جاده/محل تلاقی بین شهری، با تردد خودروئی سنگین): ۶۵۰ متر مربع

ج) مرکز خدمات جامع سلامت شهری

- E- مراکز خدمات جامع سلامت شهری: ۸۰۰ متر مربع

- F- مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستائی: ۹۰۰ متر مربع

- G- مراکز خدمات جامع سلامت شهری که دارای آزمایشگاه می باشند: ۹۰۰ متر مربع

- H- مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستائی که دارای آزمایشگاه می باشند: ۱۰۰۰ متر مربع



ویژگی های ساختمانی پایگاههای سلامت (مناطق شهری)

الف) حداقل فضاهای اداری مورد نیاز در احداث پایگاه سلامت شهری

ردیف	نوع فضا	نوع کاربری	تعداد
۱	فضای بهداشتی و درمانی	اتاق مراقبین زن	۲ باب
۲		اتاق مراقب مرد	۱ باب
۳		اتاق مامایی	۱ باب
۴		کلاس آموزش جامعه	۱ باب
۵		اتاق پزشک	۱ باب
۶		اتاق مشاورین	۲ باب
۷		سالن انتظار	۱ باب
۸	فضای خدماتی	انبار ملزومات	۱ باب
۹		انبار دارویی و بایگانی	۱ باب
۱۰		آبدارخانه	۱ باب
۱۱		سرویس بهداشتی	۱ باب
جمع			۱۳ باب

ب) تسهیلات مورد نیاز

- انشعابات آب، برق، فاضلاب، گاز، تلفن، دسترسی به اینترنت (طرح شمسی)

- دیوار کشی محوطه

ویژگی های ساختمانی مراکز سلامت شهری (مناطق شهری)

الف) حداقل فضاهای اداری مورد نیاز

تعداد	نام کاربری	
۲ باب	اتاق مراقبین زن	طبقه همکف با (پایگاه ضمیمه)
۱ باب	اتاق مراقبین مرد	
۱ باب	اتاق مامایی	
۱ باب	پذیرش	
۲ باب	اتاق پزشک	
۲ باب (زن و مرد)	تزیینات و پانسمان	
۱ باب	اتاق واکسن	
۱ باب	داروخانه	
۱ باب	آزمایشگاه (نمونه گیری)	
۲ باب	سرویس بهداشتی	
۱ باب	کارشناس تغذیه	
۱ باب	آبدارخانه	
۱ باب	سالن انتظار	
۱ باب	کلاس آموزشی	طبقه اول
۱ باب	بهداشت محیط	
۱ باب	بهداشت حرفه ای	
۱ باب	بهداشت روان	
۱ باب	دندانپزشکی	
۱ باب	سالن انتظار	
۱ باب	نمازخانه	
۱ باب	مددکاری اجتماعی	
۱ باب	سرایداری	سایر
۱ باب	تاسیسات	

ب) تسهیلات مورد نیاز

انشعابات آب، برق، فاضلاب، گاز، تلفن، دسترسی به اینترنت (فیبر نوری در قالب طرح شمس)

وضعیت پروژه های عمرانی موضوع تفاهم نامه (۳۴۰) و مناطق محروم (۱۰) پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ – فاز اول

شهرستان	پیمان سپاری شده	در حال احداث			در حال بهره برداری (اتمام احداث)		
		دانشگاه	خیرین	مشترک	دانشگاه	خیرین	مشترک
ارومیه	۴۶	۳۱	-	-	۱۳	۱	۱
اشنویه	۳	۱	-	-	۲	-	-
بوکان	۹	۸	-	-	-	-	۱
پلدشت	۲	۲	-	-	-	-	-
پیرانشهر	۲	۲	-	-	-	-	-
تکاب	۳	۳	-	-	-	-	-
چالدران	۳	۳	-	-	-	-	-
چابپاره	۵	۵	-	-	-	-	-
خوی	۱۰	۱۰	-	-	-	-	-
سردشت *	۵	۴	-	-	۱	-	-
سلماس	۶	۴	-	۲	-	-	-
شاهین دژ	۵	۵	-	-	-	-	-
شوط	۹	۷	-	-	-	۲	-
ماکو	۷	۴	۲	-	۱	-	-
مهاباد	۸	۶	-	-	۲	-	-
میاندوآب	۹	۶	-	-	۲	۱	-
نقده	۵	۵	-	-	-	-	-
جمع	۱۳۷	۱۰۶	۲	۲	۲۱	۴	۲

* دو پروژه مرکز خدمات جامع سلامت و زیست پزشکی بریسو علیرغم پیمان سپاری به دلیل وجود معارض متوقف است.

خلاصه اطلاعات مساحت پروژه های عمرانی حوزه بهداشت در طول تحول سلامت ۹۶-۱۳۹۳

شهرستان	خانه بهداشت	پیمان سپاری شده	در دست اقدام سال ۹۶
ارومیه	۳۶۳۰	۱۹۰۵۵	۲۲۹۰۰
اشنویه	۷۰	۱۱۸۳	۲۰۲۵
بوکان	۸۶۰	۳۴۰۰	۳۱۰۰
پلدشت	۴۲۰	۵۸۰	۲۳۲۰
پیرانشهر	۳۵۰	۱۵۵۰	۱۴۳۵
تکاب	۳۷۰	۱۲۸۰	۱۵۴۵
چالدران	۷۰	۱۱۸۰	۱۳۹۰
چاپاره	۳۷۰	۱۸۶۰	۹۸۵
خوی	۲۰۴۰	۴۵۴۰	۸۱۸۵
سردشت	۱۴۰	۱۱۶۰	۱۷۰۰
سلماس	۱۸۵۳	۱۷۴۰	۴۰۴۵
شاهین دژ	۸۱۰	۲۲۶۰	۲۱۰۵
شوط	۱۶۰	۴۴۱۰	۷۹۰
ماکو	۳۷۰	۳۳۶۰	۳۷۵۵
مهاباد	۴۴۰	۳۲۰۰	۳۶۶۵
میاندوآب	۱۴۰۰	۳۶۸۰	۲۶۵۰
نقده	-	۱۴۴۰	۲۴۳۰
جمع	۱۳۳۵۳	۵۵۸۷۸	۶۵۰۲۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه ۳۴۰ واحدهدایتی مورد بهره برداری ۱۳۹۵

ردیف	شهرستان	نام پروژه	نوع واحد	متولی احداث	
				دانشگاه	خیرین سلامت
۱	ارومیه**	دیزج دول	مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۲		دیزج دول	زیست پزشکی	*	
۳		دیزج مرگور	زیست پزشکی	*	
۴		اینار (حاشیه)	مرکز تسهیلات زایمانی	*	
۵		اینار (حاشیه)	مرکز ارجاع تخصصی مادر	*	
۶		ابوذر (حاشیه)	توسعه مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۷		شهدا (حاشیه)	مرکز ارجاع تخصصی	*	
۸		نیکخواه (حاشیه)	مرکز ارجاع تخصصی	*	
۹		آغداش	مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۱۰		لاله	پایگاه سلامت (حاشیه شهر)	*	
۱۱		بادیه بویان	توسعه مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۱۲		هورسین	مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۱۳		هورسین	زیست پزشکی	*	
۱۴	اشنویه	نالوس	مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۱۵		نالوس	زیست پزشکی	*	
۱۶	بوکان	شماره ۸	توسعه مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۱۷	سردشت	گل گندیک	مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۱۸	شوط	تازه کند	مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۱۹		تازه کند	زیست پزشکی	*	
۲۰	ماکو	بشگوز	مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۲۱	مهاباد	خلیفان	مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۲۲		خلیفان	زیست پزشکی	*	
۲۳	میاندوآب	باروق	مرکز خدمات جامع سلامت	*	
۲۴		باروق	زیست پزشکی	*	
۲۵		مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری			*

** در ارومیه ۳ واحد سرایداری جهت مرکز خدمات جامع سلامت ابوذر و اینار (حاشیه) و مرکز خدمات جامع سلامت امام زاده با منابع داخل دانشگاه احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت که در این جدول لحاظ نگردیده است

کمک های خیرین سلامت در برنامه احداث و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی تا پایان سال ۱۳۹۵

ردیف	نام شهرستان	کمک نقدی (هزار ریال)	ارزش ریالی زمین های اهدایی (هزار ریال)	ارزش ریالی ساختمان (هزار ریال)	ارزش ریالی تجهیزات (هزار ریال)
۱	ارومیه	۲,۶۷۵,۴۳۰	۸,۷۸۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۲	اشنویه	۰	۲,۱۴۵,۰۰۰	۰	۶,۲۵۰
۳	بوکان	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴	پلدشت	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰
۵	پیرانشهر	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۶	تکاب	۶۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
۷	سردشت	۰	۰	۰	۰
۸	سلماس	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
۹	شاهیندژ	۰	۰	۰	۰
۱۰	شوط	۰	۰	۰	۰
۱۱	چالدران	۰	۰	۰	۰
۱۲	چایپاره	۰	۰	۰	۰
۱۳	خوی	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴	ماکو	۰	۰	۰	۰
۱۵	مهاباد	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
۱۶	میاندوآب	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷	نقده	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۳۷۸۷۴۳۰	۵۳۴۲۷۰۰۰	۲۶۵۰۰۰۰۰	۲۶۴۰۲۵۰
جمع کل		۸۶۳۵۴۶۸۰			

اهداء لوح تقدیر توسط مقام عالی وزارت بهداشت به خیر سلامت استان



افتتاح آزمایشگاه تجهیز شده دی‌زج دول توسط خیر سلامت با حضور مقام عالی استان



جلسه ستاد احداث استانی با حضور مهندس پور هاشم و دکتر میرزایی اعضای کمیته ملی احداث پروژه های بهداشت



بازدید مهندس پور هاشم و دکتر میرزایی از پروژه های در دست احداث با حضور ریاست دانشگاه



مرکز خدمات جامع سلامت دیزج دول





تصاویر از محل زیست پزشک در مراکز بهداشتی درمانی



اشنویه - مرکز بهداشتی درمانی نالوس



ارومیه - مرکز بهداشتی درمانی روستائی دیزج مرگور

روند احداث واحدهای بهداشتی تا پایان سال ۱۳۹۵ (فاز یک)

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان ارومیه)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	۱۷ شهریور	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۲	المهدی	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۳	رازی	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۴	فجر (طرزیلو)	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۱۰۰۰
۵	البرز	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۶	ساوالان	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۷	بهداری	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۸	حضرت پور	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۹	طلاتپه	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۱۰	طلاتپه	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۱۱	چنقرالوی پل	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۱۲	چنقرالوی پل	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۱۳	میاوق	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۴۶۰
۱۴	میاوق	زیست پزشکی				*		۱۲۰
۱۵	ترکمان	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۱۶	ترکمان	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۱۷	بالانچ	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۴۶۰
۱۸	بالانچ	زیست پزشکی				*		۱۲۰
۱۹	نازلو	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۲۰	نازلو	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۲۱	بالو	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۲۲	بالو	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۲۳	قولنجی	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۴۶۰
۲۴	قولنجی	زیست پزشکی				*		۱۲۰
۲۵	قولنجی	تسهیلات زایمانی				*		۱۰۵
۲۶	وکیل آباد	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۲۷	شاهد	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۲۸	فرهنگیان	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۲۹	موانا	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۵۲۰
۳۰	موانا	زیست پزشکی	*					۶۰
۳۱	موانا	پایگاه فوریت های پزشکی	*					۱۵۰
۳۲	بند	مرکز خدمات جامع سلامت	*		از محل اعتبارات ملی			۶۸۰
۳۳	بند	زیست پزشکی	*		از محل اعتبارات ملی			۱۲۰

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۳۴	هورسین	مرکز خدمات جامع سلامت	*		از محل اعتبارات ملی			۵۳۰
۳۵	هورسین	زیست پزشکی	*		از محل اعتبارات ملی			۱۲۰
۳۶	دیزج دول	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۶۴۰
۳۷	دیزج دول	زیست پزشکی	*					۸۰
۳۸	دیزج مرگور	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۳۹	ابودر (حاشیه)	توسعه مرکز خدمات جامع سلامت	*					۲۷۰
۴۰	شهدا (حاشیه)	مرکز ارجاع تخصصی	*					۲۱۰
۴۱	نیکخواه (حاشیه)	مرکز ارجاع تخصصی	*					۲۵۰
۴۲	مادر (حاشیه شهر و روستا)	تسهیلات زایمانی (LDRP)	*					۱۰۰۰
	مادر (حاشیه شهر و روستا)	مرکز ارجاع تخصصی	*					
۴۴	آغداش	مرکز خدمات جامع سلامت	*			*		۱۱۰۰
۴۵	لاله	پایگاه سلامت (حاشیه شهر)				*		۲۸۰
۴۶	بادیه پویان	توسعه مرکز خدمات جامع سلامت	*					۵۰۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان اشنویه)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	نالوس	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۷۸۳
۲	نالوس	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۳	صبا	پایگاه سلامت			*			۲۸۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان بوکان)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	شماره ۸	توسعه مرکز خدمات جامع سلامت	*					۵۸۰
۲	رحیم خان	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۵۲۰
۳	رحیم خان	زیست پزشکی	*					۶۰
۴	تیکانتپه	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۵۲۰
۵	تیکانتپه	زیست پزشکی	*					۶۰
۶	شماره ۷	مرکز خدمات جامع سلامت		*				۸۰۰
۷	دانش	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۸	کوره کانی	مرکز خدمات جامع سلامت		از محل اعتبارات ملی			*	۵۲۰
۹	کوره کانی	زیست پزشکی		از محل اعتبارات ملی			*	۶۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان پلدشت)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	پورناک	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۴۶۰
۲	پورناک	زیست پزشکی				*		۱۲۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان پیرانشهر)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	شماره یک	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۵۵۰
۲	شماره ۳	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۱۰۰۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان تکاب)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	شهیدبحری	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۲۰
۲	شریف آباد	پایگاه سلامت				*		۲۸۰
۳	شهیدبحری	آزمایشگاه ستادی	*					۱۸۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان چالدران)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	شماره ۱	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۷۲۰
۲	آزمایشگاه ستادی	شماره ۱	*					۱۸۰
۳	شماره ۱	پایگاه سلامت	*					۲۸۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان چابهار)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	شماره ۱	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۲۰
۲	شماره ۱	آزمایشگاه ستادی	*					۱۸۰
۳	شماره ۲	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
*۴	قره کندی (کامل آباد)	مرکز خدمات جامع سلامت	*		اعتبارات ملی ۵ پروژه			۴۶۰
*۵	قره کندی (کامل آباد)	زیست پزشکی	*		اعتبارات ملی ۵ پروژه			۱۲۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان خوی)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	شهیدمطهری	مرکز خدمات جامع سلامت						۹۰۰
۲	شهیدخورابلو	مرکز خدمات جامع سلامت						۹۰۰
۳	زرآباد	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۷۷۵
۴	زرآباد	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۵	زرآباد	تسهیلات زایمانی	*					۱۰۵
۶	دیزج دیز	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۷۸۰
۷	دیزج دیز	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۸	جمشیدآباد	پایگاه سلامت		*				۲۸۰
۹	یدیلر	پایگاه سلامت		*				۲۸۰
۱۰	کوی صفا	پایگاه سلامت		*				۲۸۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان سردشت)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	اسلام آباد	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۲	اسلام آباد	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۳	گل گندینگ	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۵۸۰
۴	بریسو	مرکز خدمات جامع سلامت	این پروژه علیرغم پیمان سپاری، بدلیل محیطی متوقف شده است					۴۶۰
۵	بریسو	زیست پزشکی	این پروژه علیرغم پیمان سپاری، بدلیل محیطی متوقف شده است					۱۲۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان سلماس)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	سیلاب	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۲	سیلاب	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۳	کوزه رش	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۴	کوزه رش	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۵	سلطان احمد	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۴۶۰
۶	سلطان احمد	زیست پزشکی				*		۱۲۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان شاهیندر)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	شماره ۱	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۲	شماره ۲	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۷۲۰
۳	شماره ۲	آزمایشگاه ستادی	*					۱۸۰
۴	جانبازان	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۵	شماره ۲	پایگاه غیرضمیمه	*					۲۸۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان شوط)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	تازه کند	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۹۳۰
۲	تازه کند	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۳	مخور	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۴	مخور	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۵	شماره ۱	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۶	مرگنر	مرکز خدمات جامع سلامت		*				۹۸۰
۷	مرگنر	زیست پزشکی		*				۱۲۰
۸	شماره ۱	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۹	ستاد شبکه	ستاد شبکه شهرستان	*					۶۰۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان ماکو)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	بشگوز	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۲	قره تپه	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۳	قره تپه	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۴	شماره ۳	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۵	ستاد شبکه	ستاد شبکه شهرستان	*					۶۰۰
۶	گریگ	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۴۶۰
۷	گریگ	زیست پزشکی					*	۱۲۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان مهاباد)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	خلیفان	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۲	خلیفان	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۳	فرهنگیان	مرکز خدمات جامع سلامت			اوقاف			۸۰۰
۴	شافعی	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۸۰۰
۵	شافعی	آزمایشگاه ستادی				*		۱۸۰
۶	فجر	پایگاه سلامت		پیمان سپاری شده ولی بدلیل وجود معارض پروژه متوقف است.		*		۲۸۰
۷	فرهنگیان	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۸	کشاوری	پایگاه سلامت			*			۲۸۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان میاندوآب)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	باروق	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۶۸۰
۲	باروق	زیست پزشک	*					۱۲۰
۳	مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری		*					۱۲۰
۴	دانش تپه	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۵	دانش تپه	زیست پزشک	*					۱۲۰
۶	فسندوز	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۷	فسندوز	زیست پزشک	*					۱۲۰
۸	شماره ۱	مرکز خدمات جامع سلامت		*				۸۰۰
۹	شماره ۵	مرکز خدمات جامع سلامت		*				۸۰۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه پیمان سپاری شده تا پایان سال ۱۳۹۵ (شهرستان نقده)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					زیر بنا (مترمربع)
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	حاجی آباد	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۲	حاجی آباد	زیست پزشک	*					۱۲۰
۳	میرآباد	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۴	میرآباد	زیست پزشک	*					۱۲۰
۵	محمدیار	پایگاه سلامت	*					۲۸۰

روند احداث واحدهای بهداشتی در سال ۱۳۹۶

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان ارومیه)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					متر از واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	کوهنورد	مرکز خدمات جامع سلامت						۸۰۰
۲	الواج	مرکز خدمات جامع سلامت		*				۸۰۰
۳	صحبه	مرکز خدمات جامع سلامت						۱۵۰۰
۴	رودکی	مرکز خدمات جامع سلامت			*			۸۰۰
۵	مرکز آموزش بهورزی		*					۲۵۰۰
۶	اسلام آباد المهدی	پایگاه سلامت						۲۸۰
۷	فرشته	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۸	دیزج مرگور	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۵۸۰
۹	دیزج مرگور	آزمایشگاه ستادی				*		۲۰۰
۱۰	دیزج مرگور	ارجاع تخصصی				*		۵۸۰
۱۱	ثاراله	پایگاه سلامت		*				۲۸۰
۱۲	نور	پایگاه سلامت		*				۲۸۰
۱۳	خاتون	پایگاه سلامت		*				۲۸۰
۱۴	کوهنورد	پایگاه سلامت						۲۸۰
۱۵	زیباشهر	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۱۶	علامه مجلسی	پایگاه سلامت						۲۸۰
۱۷	اسلام آباد نیکخواه	مرکز خدمات جامع سلامت						۸۰۰
۱۸	عدالت	پایگاه سلامت		*				۲۸۰
۱۹	ایثار	پایگاه سلامت غیرضمیمه	*					۲۸۰
۲۰	ایثار	آزمایشگاه ستادی	*					۲۸۰
۲۱	اقبال	مرکز خدمات جامع سلامت و معین پزشک خانواده	*					۱۰۰۰
۲۲	اقبال	آزمایشگاه ستادی	*					۲۰۰
۲۳	سیلوانا*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۲۰۰
۲۴	سیلوانا*	زیست پزشک					*	۱۲۰
۲۵	لاله	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۸۰۰
۲۶	گوگ تپه*	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۵۸۰
۲۷	قره حسنلو*	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۵۸۰
۲۸	ولنده علیا*	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۵۸۰
۲۹	بادکی*	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۵۸۰
۳۰	خانقاه الواج*	مرکز خدمات جامع سلامت				*		۵۸۰
۳۱	توپراق قلعه*	مرکز خدمات جامع سلامت						۸۰۰

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					متر از واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۳۲	صداقه*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۷۳۰
۳۳	لور*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۵۸۰
۳۴	ژارا باد*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۵۸۰
۳۵	ساعتلو*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۵۸۰
۳۶	بند	پایگاه سلامت روستایی					*	۲۸۰
۳۷	راژان ۲	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۳۸	شیرکان	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۳۹	زیوه	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۰	کنیسی	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۱	قره حسنلوزلو	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۲	حیدرلوی سیر	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۳	گزنه کش*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۴	مبارک آباد*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۵	بابارود*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۶	جلبر*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۷	چناقلو	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۸	زیوه ۲*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۴۹	قزل عاشق ۲*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۰	کهریز ۲*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۱	پسان*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۲	میاوق ۲*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۳	بهلول آباد*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۴	بالولان*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۵	ولنده سفلی*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۶	جهتلو*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۷	صداقه*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۸	بالانج ۲*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵۹	چنقرالوی پل ۲*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۶۰	شیخ شمرین*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۶۱	سورکان*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۶۲	دزگیر*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۶۳	مستکان*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۶۴	تازه کندافشار*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۶۵	عربلوی بیشه*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۶۶	فلکان*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۶۷	چوبتراش*	خانه بهداشت					*	۱۰۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان اشنویه)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرداری	خیرین	شورای روستا	
۱	نالوس	سرایداری	*					۶۰
۲	سیدآباد	پایگاه سلامت						۲۸۰
۳	شماره ۲	مرکز جامع سلامت	*					۸۰۰
۴	شماره ۲	آزمایشگاه ستادی	*					۲۰۰
۵	آغ بلاغ	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۶	آغ بلاغ	زیست پزشک	*					۱۲۰
۷	اسلاملو	خانه بهداشت	*					۱۰۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان بوکان)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرداری	خیرین	شورای روستا	
۱	**ناچیت	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۵۲۰
۲	**ناچیت	زیست پزشک					*	۶۰
۳	شماره ۴	مرکز خدمات جامع سلامت						۸۰۰
۴	مهر	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۵	**گول بهی	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۵۸۰
۶	**قارنجه	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۵۸۰
۷	سیمینه	پایگاه سلامت						۲۸۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان پلدشت)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرداری	خیرین	شورای روستا	
۱	مرکز شماره ۱	مرکز خدمات جامع سلامت			*منطقه آزاد			۸۰۰
۲	مرکز شماره ۱	زیست پزشک			*منطقه آزاد			۱۲۰
۳	ستادشبه	ستادشبه شهرستان			*منطقه آزاد			۶۰۰
۴	نازک علیا	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۶۸۰
۵	نازک علیا	زیست پزشک	*					۱۲۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان پیرانشهر)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرداری	خیرین	شورای روستا	
۱	کهنه خانه	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۲	زرگتن	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۳	شین آباد	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۴	سیلوه	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵	گرده سور*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۶	جران*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۷	کشاورز	پایگاه سلامت						۲۸۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان تکاب)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرداری	خیرین	شورای روستا	
۱	چمران	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۲	قره بلاغ	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۴۶۰
۳	قره بلاغ	زیست پزشک					*	۱۲۰
۴	زرشوران*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۴۶۰
۵	زرشوران*	زیست پزشک					*	۱۲۰
۶	قراقیه	خانه بهداشت	*					۱۰۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان چالدران)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرداری	خیرین	شورای روستا	
۱	ستادشبه	ستادشبه شهرستان	*					۶۰۰
۲	زاویه سفلی*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۴۶۰
۳	زاویه سفلی*	زیست پزشک					*	۱۲۰
۴	سازآغل*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۵	صدر*	خانه بهداشت					*	۱۰۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان چابهاره)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	ستادشبهه	ستادشبهه شهرستان	*					۶۰۰
۲	امام علی	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۳	قنات میرزا جلیل	خانه بهداشت	*					۱۰۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان خوی)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	حافظ	پایگاه سلامت			نگارخانه			۲۸۰
۲	صمدزاده	مرکز خدمات جامع سلامت						۸۰۰
۳	آزمایشگاه ستادی	مرکز بهداشت شهرستان خوی	*					۲۰۰
۴	ابوالغلی	مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی	*					۹۰۰
۵	کلوانس	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۵۸۰
۶	قطور	تسهیلات زایمانی	*					۱۰۵
۷	قطور	زیست پزشک	*					۱۲۰
۸	سعلکده	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۵۸۰
۹	بلسور	زیست پزشک	*					۱۲۰
۱۰	صفرزاده	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۱۱	امام حسین	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۱۲	بیزنده	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۱۳	قره شعبان	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۱۴	مرتضی قلی کندی	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۱۵	فناپی	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۱۶	زاویه حسن خان	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۱۷	اکبرآباد	خانه بهداشت	*				*	۱۰۵
۱۸	حبش سفلی	خانه بهداشت	*					۱۰۵

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					متراف واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرداری	خیرین	شورای روستا	
۱۹	حبش علیا	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۲۰	یزدپکان*	مرکز خدمات جامع سلامت						۵۲۰
۲۱	یزدپکان*	زیست پزشک						۶۰
۲۲	پسک سفلی*	مرکز خدمات جامع سلامت						۵۲۰
۲۳	پسک سفلی*	زیست پزشک						۶۰
۲۴	اکبرآباد*	مرکز خدمات جامع سلامت						۵۸۰
۲۵	کفچلین*	خانه بهداشت						۱۰۵
۲۶	بیانلو*	خانه بهداشت						۱۰۵
۲۷	هندوان*	خانه بهداشت						۱۰۵
۲۸	قشقابلاغ*	خانه بهداشت						۱۰۵
۲۹	بولاماج*	خانه بهداشت						۱۰۵
۳۰	احمدآباد*	خانه بهداشت						۱۰۵
۳۱	آغ باش*	خانه بهداشت						۱۰۵
۳۲	حصار*	خانه بهداشت						۱۰۵
۳۳	بلسور	مرکز خدمات جامع سلامت						۵۲۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان سردشت)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					متراف واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرداری	خیرین	شورای روستا	
۱	میرآباد	زیست پزشک (شبانه روزی)	*					۱۲۰
۲	میرآباد	سرایداری	*					۶۰
۳	میرآباد	تسهیلات زایمانی	*					۱۰۵
۴	ربط	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۵	ربط	زیست پزشک	*					۱۲۰
۶	ربط	تسهیلات زایمانی	*					۱۰۵
۷	نلاس	پایگاه غیرضمیمه	*					۲۸۰
۸	اسلام آباد	تسهیلات زایمانی	*					۱۱۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان سلماس)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	همراز	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۲	چمران	پایگاه سلامت		*				۲۸۰
۳	رازی	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۴	مرکز آموزش بهورزی				*			۱۵۰۰
۵	شماره ۴ (مولوی)	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۶	قلی پور	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۷	شیرکی*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۸	هفتوان	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۵۸۰
۹	هفتوان	زیست پزشک					*	۱۲۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان شاهیندر)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	کشاوری	مرکز خدمات جامع سلامت شبهانه روزی	*					۷۲۰
۲	کشاوری	زیست پزشک	*					۱۲۰
۳	محمودآباد	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۴	محمودآباد	زیست پزشک	*					۱۲۰
۵	آغچه مسجد	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۶	آق تپه*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۵۸۰

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان شوط)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	یولاگلدی ۱	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۲	قره ایاق*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۴۶۰
۳	قره ایاق*	زیست پزشک					*	۱۲۰
۴	ایل بلاغی	خانه بهداشت					*	۱۰۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان ماکو)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	شماره ۱	پایگاه سلامت						۵۰۰
۲	بازرگان	پایگاه سلامت						۲۸۰
۳	مرکز آموزش بهورزی							۱۵۰۰
۴	باغچه جوق ۱	خانه بهداشت						۱۰۵
۵	باغچه جوق ۲*	خانه بهداشت						۱۰۵
۶	باغچه جوق *	مرکز خدمات جامع سلامت						۴۶۰
۷	باغچه جوق *	زیست پزشک						۱۲۰
۸	کشمش تپه *	مرکز خدمات جامع سلامت						۴۶۰
۹	کشمش تپه *	زیست پزشک						۱۲۰
۱۰	کشمش تپه ۲*	خانه بهداشت						۱۰۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان مهاباد)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائ واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	پشت تپ شیلان	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۲	فارابی	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۸۰۰
۳	مکریان	پایگاه سلامت						۲۸۰
۴	خانگی	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۴۶۰
۵	خانگی	زیست پزشک					*	۱۲۰
۶	کله گاوی	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۷	کلیجه	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۸	اطمیش	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۹	قم قلعه ۲	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۱۰	ترشکان	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۱۱	یوسف کند	پایگاه سلامت روستایی					*	۱۲۰
۱۲	صبا	مرکز خدمات جامع سلامت						۸۰۰
۱۳	توحید	پایگاه سلامت شهری						۲۸۰
۱۴	قره بلاغ	خانه بهداشت					*	۱۰۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان میاندوآب)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائز واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	لیلان چای	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۲	نماز	پایگاه سلامت			*			۲۸۰
۳	چالخاماز	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۴۶۰
۴	چالخاماز	زیست پزشکی	*					۱۲۰
۵	آزمایشگاه ستادی				نگارخانه			۱۸۰
۶	سرچنار*	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۴۶۰
۷	سرچنار*	زیست پزشکی					*	۱۲۰
۸	ساتلمیش توپخانه	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۹	نظام آباد	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۱۰	قیپچاق ۲	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۱۱	چیلیک	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۱۲	حاجی بهزاد	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۱۳	شین اباد*	خانه بهداشت					*	۱۰۵
۱۴	دوه چی*	خانه بهداشت					*	۱۰۵

پروژه های مصوب وفق تفاهم نامه در دست اقدام سال ۱۳۹۶ (شهرستان نقده)

ردیف	نام پروژه	نوع واحد	زمین مورد نیاز					مترائز واحد احداثی
			ملکی	شهرداری	راه و شهرسازی	خیرین	شورای روستا	
۱	حلبی	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۲	خلیفان	خانه بهداشت	*					۱۰۵
۳	آزمایشگاه ستادی	آزمایشگاه ستادی شهرستان				*		۱۸۰
۴	صیادی فر	پایگاه سلامت	*					۲۸۰
۵	چیانه	مرکز خدمات جامع سلامت					*	۴۶۰
۶	شماره ۲	مرکز خدمات جامع سلامت	*					۹۰۰
۷	بنفشه	پایگاه سلامت			نگارخانه			۲۸۰
۸	چیانه	زیست پزشکی					*	۱۲۰

واحد های بهداشتی پیمان سیاری شده در سه ماهه اول ۱۳۹۶

ردیف	نام شهرستان	نام واحد بهداشتی
۱	ارومیه	رودکی
۲	ارومیه	نور
۳	ارومیه	کوهنورد
۴	ارومیه	علامه مجلسی
۵	ارومیه	عدالت
۶	ارومیه	گوگ تپه *
۷	ارومیه	قره حسنلوی نازلو *
۸	ارومیه	ولنده سفلی *
۹	ارومیه	جهتلو *
۱۰	اشنویه	آغبلاغ
۱۱	اشنویه	زیست آغبلاغ
۱۲	پیرانشهر	زرگتن
۱۳	چالدران	ستاد شبکه شهرستان (خرید ساختمان)
۱۴	چاپاره	ستاد شبکه شهرستان
۱۵	سردشت	ربط
۱۶	سردشت	زیست ربط
۱۷	سردشت	تسهیلات ربط
۱۸	سردشت	تسهیلات اسلام آباد
۱۹	سلماس	شهید همراز
۲۰	سلماس	رازی
۲۱	ماکو	آموزش بهورزی
۲۲	مهاباد	کله گاوی
۲۳	مهاباد	قره بلاغ
۲۴	میاندوآب	لیلان چای
۲۵	میاندوآب	سرچنار *
۲۶	میاندوآب	زیست سرچنار *
۲۷	میاندوآب	ساتلمیش توپخانه
۲۸	میاندوآب	نظام آباد
۲۹	میاندوآب	قیپچاق ۲
۳۰	میاندوآب	چلیک
۳۱	میاندوآب	حاجی بهزاد *
۳۲	میاندوآب	دوه چی *

